計　画　工　程　表

阿賀野バイパス　１６工区改良その４工事	受注者	株式会社　皆川組	施工地	新潟県阿賀野市百津地先	工　期	平成31年 3月 19日～令和2年 2月 2日	321日間
	発注者	北陸地方整備局　新潟国道事務所			変更工期		

工種	種　目	数量	単位	変更数量	構成比率	変更構成比率	備　考
準備工		1	式		2.7		
道路土工	掘削	7,400	m3		3.5		
	土砂等運搬	8,220	m3		5.1		
	路体(築堤)盛土 4.0m≦W	8,000	m3		2.3		
カルバート工 作業土工	床掘り	1,400	m3		0.7		
	埋戻し	500	m3		1.4		
	基面整正	280	m2		0.2		
	積込（ルーズ）	560	m3		0.2		
	土砂等運搬	1,960	m3		1.2		
場所打函渠工	基礎材　RC-40 t=200mm	280	m2		0.7		
	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　t=100mm 18-8-40BB W/C65%以下	280	m2		0.9		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40BB W/C55%以下	788	m3		26.4		
	鉄筋　SD345　D13	12.39	t		3.2		
	鉄筋　SD345　D16～25	61.89	t		15.6		
	鉄筋　SD345　D29～32	1.83	t		0.5		
	型枠	1,370	m2		17.9		
	円筒型枠	6	m		0.0		
	支保　f≦40kN/m2{t≦120cm}	1,310	空m3		6.6		
	足場	730	掛m2		4.8		
	目地板	12	m2		0.1		
場所打函渠付帯工	中詰め土　4.0m≦W	200	m3		0.3		
	敷砂利　RC-40　t=150mm	180	m2		0.1		
	継手　II-A型	10	m		0.2		
	継手　II-B型	13	m		0.4		
	継手　III型	9	m		0.2		
	補強鉄筋　SD345 D13	0.01	t		0.0		
	銘板　品質等表示用 500*500*8	1	枚		0.2		
防水工	防水　底頂部　防水シート W=1.0m　t=3.2mm	10	m2		0.1		
	防水　側部外防水　防水シートW=1.0m　t=3.2mm	3	m2		0.0		
排水構造物工 作業土工	床掘り	170	m3		0.1		
	埋戻し	160	m3		0.5		
	基面整正	6	m2		0.0		
	積込（ルーズ）	180	m3		0.1		
	土砂等運搬	360	m3		0.2		
集水桝・マンホール工	現場打ち集水桝　MF種18-8-40BB　W/C≦60%	2	箇所		0.7		
	蓋　S-B650-L1300-t12	4	枚		0.3		
防護柵工	ガードレールGr-C-2B標準4色	30	m		0.5		
	補強鉄筋　SD345 D13	0.05	t		0.0		
構造物撤去工	構造物取壊し工	1	式		0.3		
	運搬処理工	1	式		0.2		
仮設工	工事用道路工	1	式		0.1		
	水替え工	1	式		0.2		
	仮水路工	1	式		0.3		
後片付け		1	式		0.9		

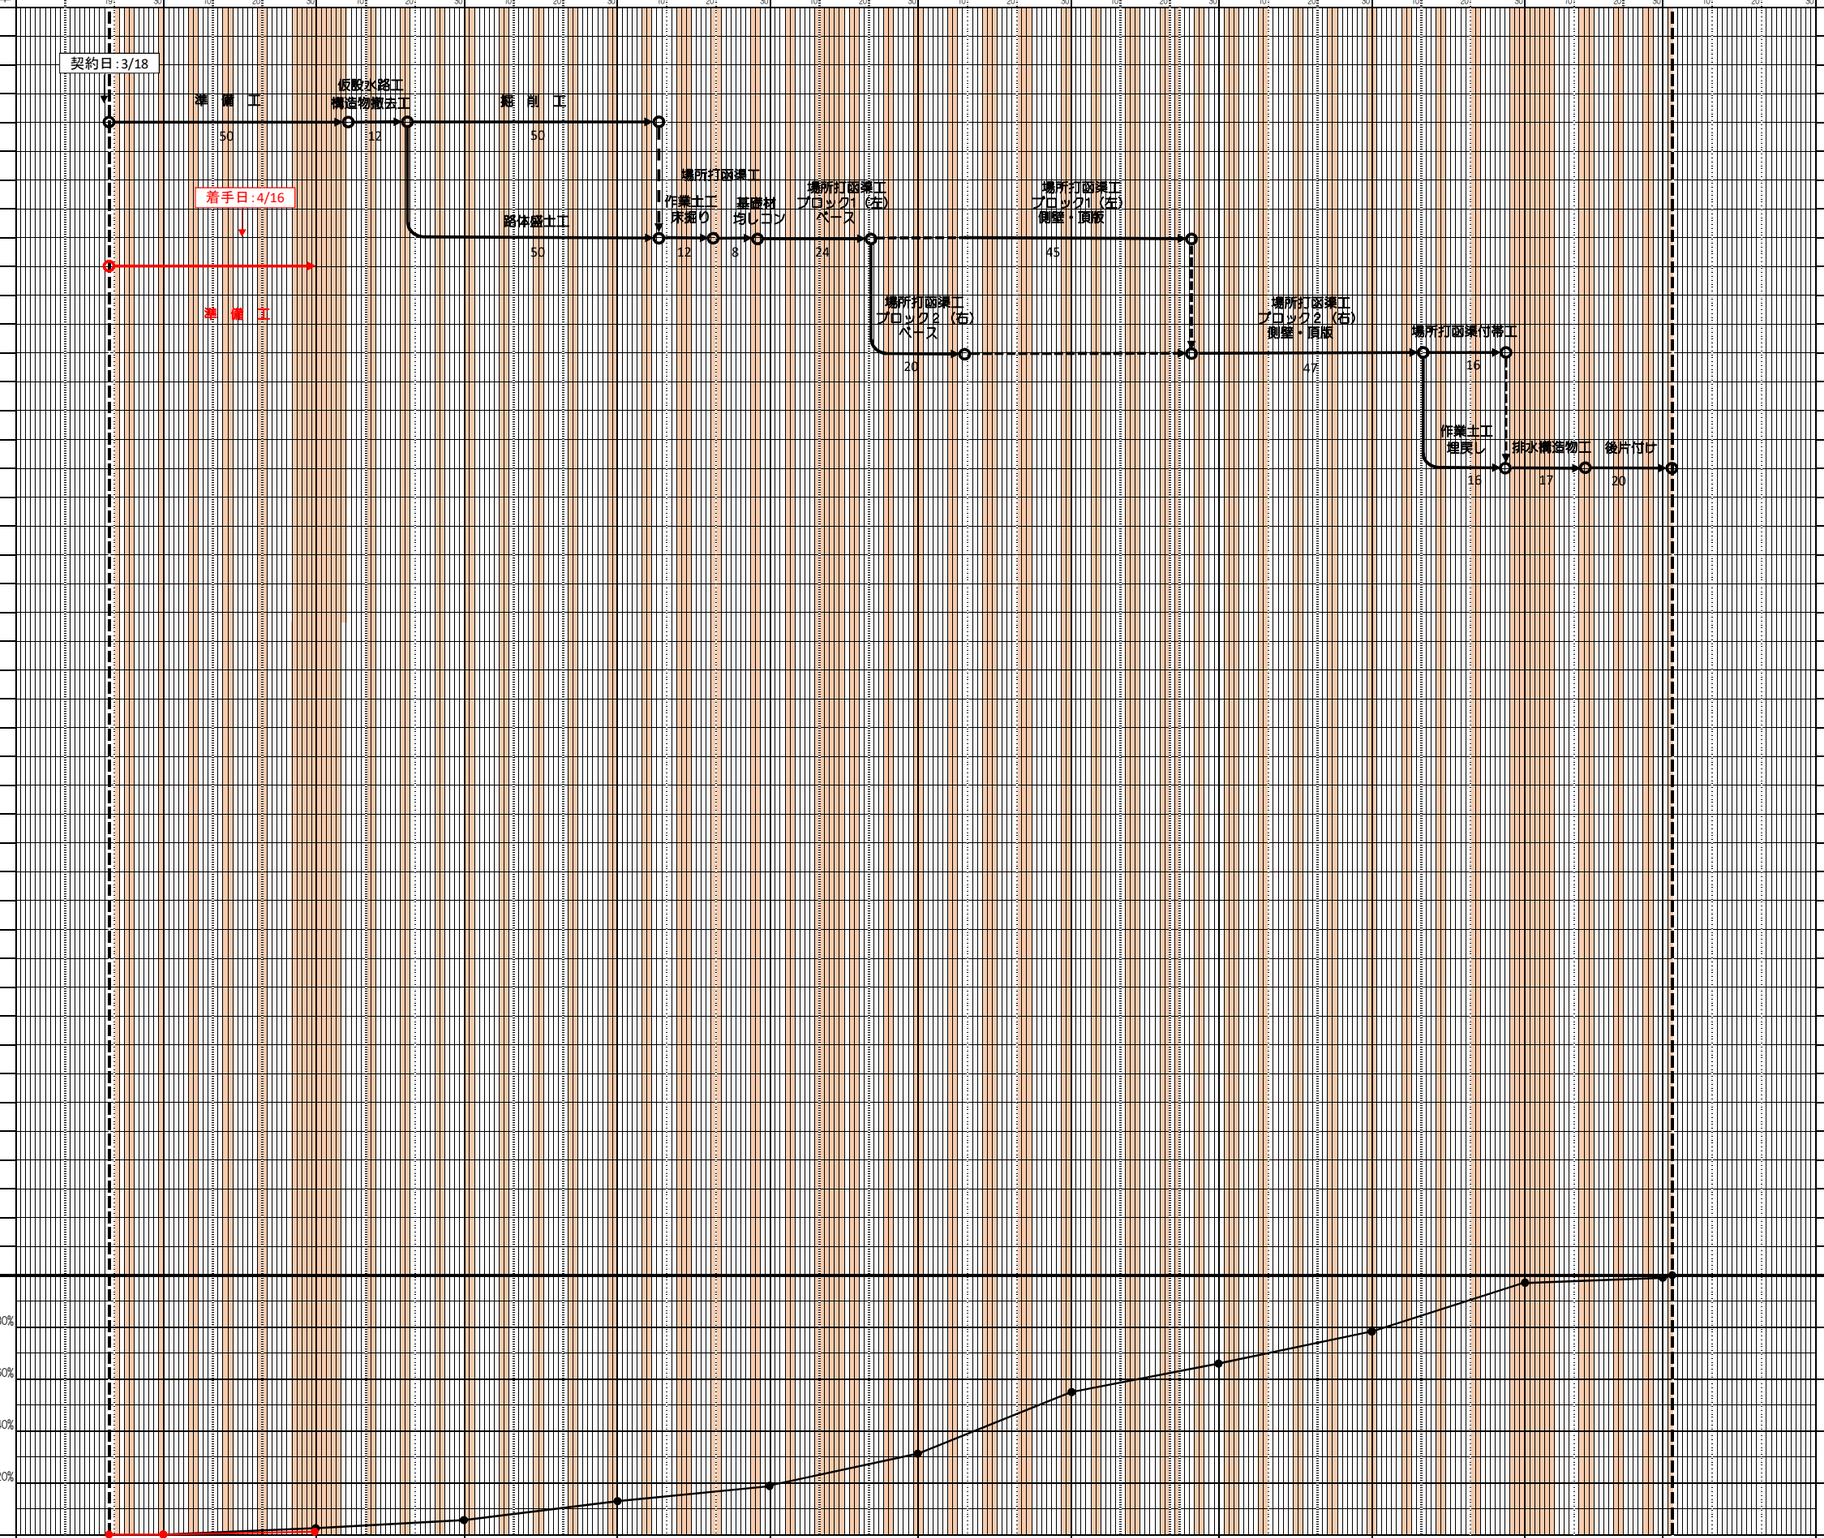

計画	0.0%	2.7%	5.7%	12.3%	18.7%	30.5	55.7	64.6	78.8	97.2	99.1%	100%
実施	0.0%	0.9%										
