ミナガワタイムス 12月

発行日：令和５年12月5日　発行人：株式会社　皆川組

地盤改良工事の進み具合

日頃より建設工事にご理解、ご協力頂き御礼を申し上げます。
11月6日から地盤改良工の施工を開始し、杭径1.6m長さ（杭長）26.5mの改良体72本を11月15日に施工完了しました。引き続き、杭径1.6m長さ（杭長）15.7mの改良体を11月30日で216本中132本の施工を終えました。全本数の完了予定は12月8日を予定しています。地域の皆様方には御不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

工　事　概　要

工事名	小須戸橋左岸取付道路その6工事
工事場所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工事期間	令和５年８月10日　～　令和６年2月11日
作業時間	８：００～１７：００（原則　土・日・祝日は休工） ※週休2日に取り組む工事です。工程によって早出残業あり
工事内容	本工事は信濃川に架かる小須戸橋の架け替え工事に伴い、左岸取付道路の地盤改良工が主であり、今回受注した軟弱地盤箇所を深層混合処理工法にて改良体を造成する工事である。 ＜主な工種＞ 道路土工１式、地盤改良工１式、排水構造物工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式

工事の問い合わせ先

施工者	株式会社　皆川組 【現場事務所】新潟市南区次郎右工門興野宇居付135-1 TEL：025-374-6390　　FAX：025-374-6399 現場代理人：菅原　徹 監理技術者：野口　治
発注者	国土交通省　北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所　工務課 TEL：025-266-7133（直通）

※　工事に関することでお気づきの点がございましたら、皆川組の問い合わせ先にご連絡くださるようお願いいたします。

月　間　工　程　表

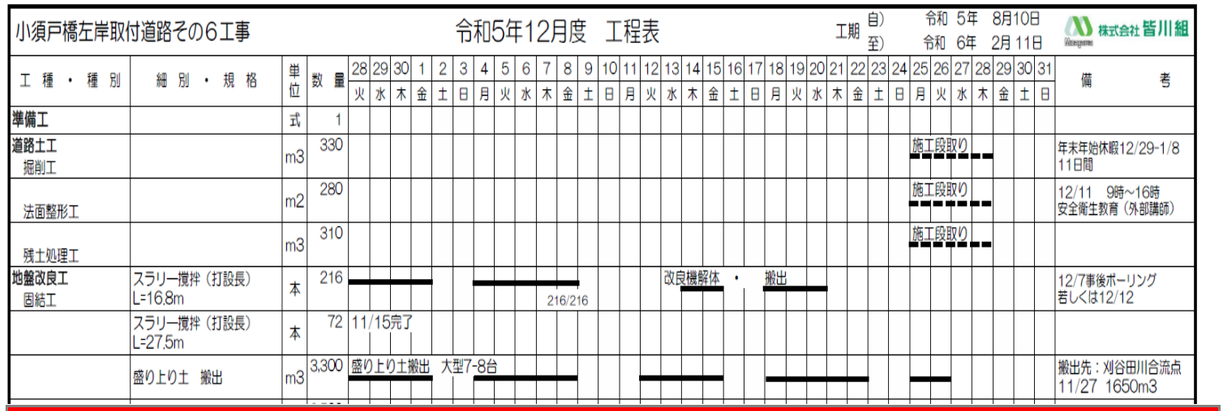

小須戸橋左岸取付道路その6工事　令和5年12月度　工程表　工期 自）令和 5年 8月10日 至）令和 6年 2月11日　株式会社 皆川組

工種・種別	細別・規格	単位	数量	備考
準備工		式	1	
道路土工 掘削工		m3	330	施工段取り　年末年始休暇12/29-1/8 11日間
法面整形工		m2	280	施工段取り　12/11　9時～16時 安全衛生教育（外部講師）
残土処理工		m3	310	施工段取り
地盤改良工 固結工	スラリー攪拌（打設長）L=16.8m	本	216	216/216　改良機解体・搬出　12/7事後ボーリング 若しくは12/12
	スラリー攪拌（打設長）L=27.5m	本	72	11/15完了
	盛り上り土　搬出	m3	3,300	盛り上り土搬出　大型7-8台　搬出先：刈谷田川合流点 11/27　1650m3

現　場　進　捗　図・写　真

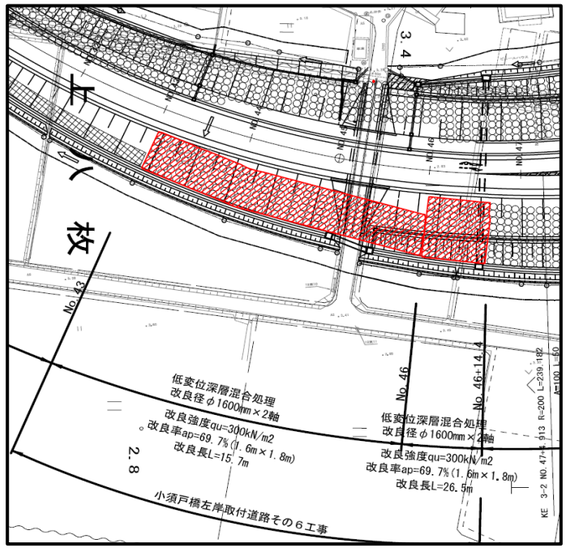

12月4日撮影

地盤改良工

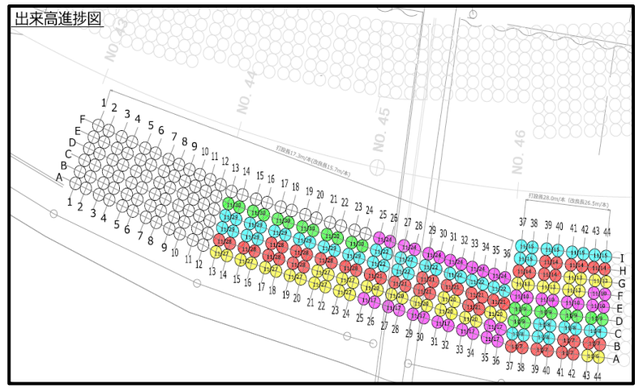

11月30日　204/288本施工完了

12月4日撮影

※ホームページ公開中
