ミナガワタイムス 2月

発行日：令和6年2月 8日　発行人：株式会社　皆川組

工事の進み具合

日頃より建設工事にご理解、ご協力頂き御礼を申し上げます。
1月9日から仮設工（敷鉄板集積・返却）の施工を開始し、中旬から排水構造物工（暗渠管Φ600　L=36m　集水桝2基、排水フリューム　L=10m、パイプライン　L=46m）を順調に施工しております。引き続き、道路土工、排水構造物工、仮設工の施工を行い、季節柄雨・雪の日が多くなりますが、より安全な施工と品質確保に努め工事を進めてまいります。地域の皆様方には御不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

工　事　概　要

工事名	小須戸橋左岸取付道路その6工事
工事場所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工事期間	令和５年８月10日　～　令和６年3月25日
作業時間	８：００～１７：００（原則　土・日・祝日は休工） ※週休2日に取り組む工事です。工程によって早出残業あり
工事内容	本工事は信濃川に架かる小須戸橋の架け替え工事に伴い、左岸取付道路の地盤改良工が主であり、今回受注した軟弱地盤箇所を深層混合処理工法にて改良体を造成する工事である。 ＜主な工種＞ 道路土工１式、地盤改良工１式、排水構造物工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
工事の問い合わせ先	
施工者	株式会社　皆川組 【現場事務所】新潟市南区次郎右工門興野宇居付135-1 TEL：025-374-6390　　FAX：025-374-6399 現場代理人：菅原　徹 監理技術者：野口　治
発注者	国土交通省　北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所　工務課 TEL：025-266-7133（直通）

※　工事に関することでお気づきの点がございましたら、皆川組の問い合わせ先にご連絡くださるようお願いいたします。

月　間　工　程　表

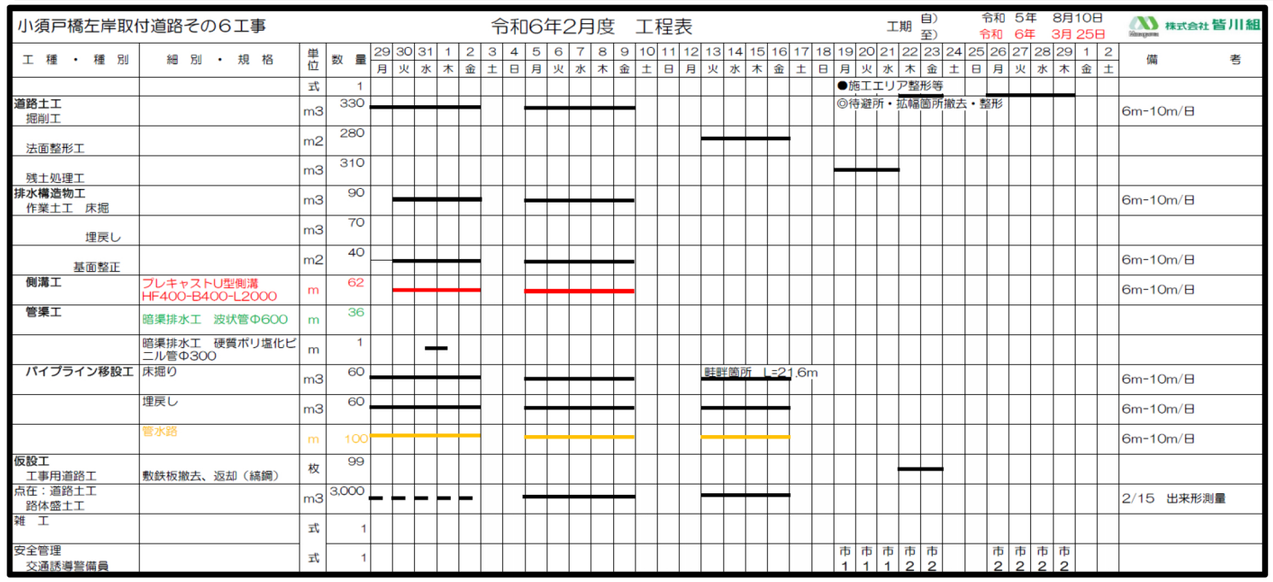

現　場　進　捗　図・写　真

※ホームページ公開中
