工事名：横場新田地区河道掘削その６外工事

計　画　工　程　表

工 期 (自)　令和3年　5月　8日
(至)　令和3年12月12日（219日間）

株式会社 皆川組

工　種	種別・細別	単位	数　量	変更数量	構成比率(%)
築堤護岸					
準備工		式	1		1.6
【横場新田地区】					84.4
河川土工		式	1		66.9
掘削工		式	1		4.9
	掘削	m3	20,800		3.3
	掘削（水中）	m3	4,100		1.6
残土処理工		式	1		62.1
	土砂等運搬L=31.5km以下	m3	16,260		40.5
	土砂等運搬L=49.5km以下	m3	8,640		21.5
地盤改良工		式	1		17.1
自走式土質改良工		式	1		17.1
	土砂等運搬L=0.3km以下	m3	7,500		1.9
	土質改良　生石灰	m3	7,500		13.2
	整地	m3	7,500		0.7
	積込み（ルーズ ）	m3	7,500		1.1
仮設工		式	1		0.4
工事用道路工		式	1		0.2
	敷鉄板設置撤去	枚	107		0.2
汚濁防止工		式	1		0.2
	汚濁防止フェンス設置撤去	m	20		0.2
【西野地区】					13.2
河川土工		式	1		1.0
掘削工		式	1		0.4
	掘削	m3	1,600		0.4
盛土工		式	1		0.1
	路体（築堤）盛土	m3	1,000		0.1
残土処理工工		式	1		0.5
	整地	m3	1,600		0.1
	土砂等運搬L=0.3km以下	m3	1,600		0.4
付帯道路工		式	1		12.1
	下層路盤RC-40,t=150	m2	7,390		3.6
	表層　密粒度ｱｽｺﾝt=50	m2	7,390		8.4
仮設工		式	1		0.1
交通管理工		式	1		0.1
	交通誘導警備員B	人日	11		0.1
後片付け工		式	1		0.8

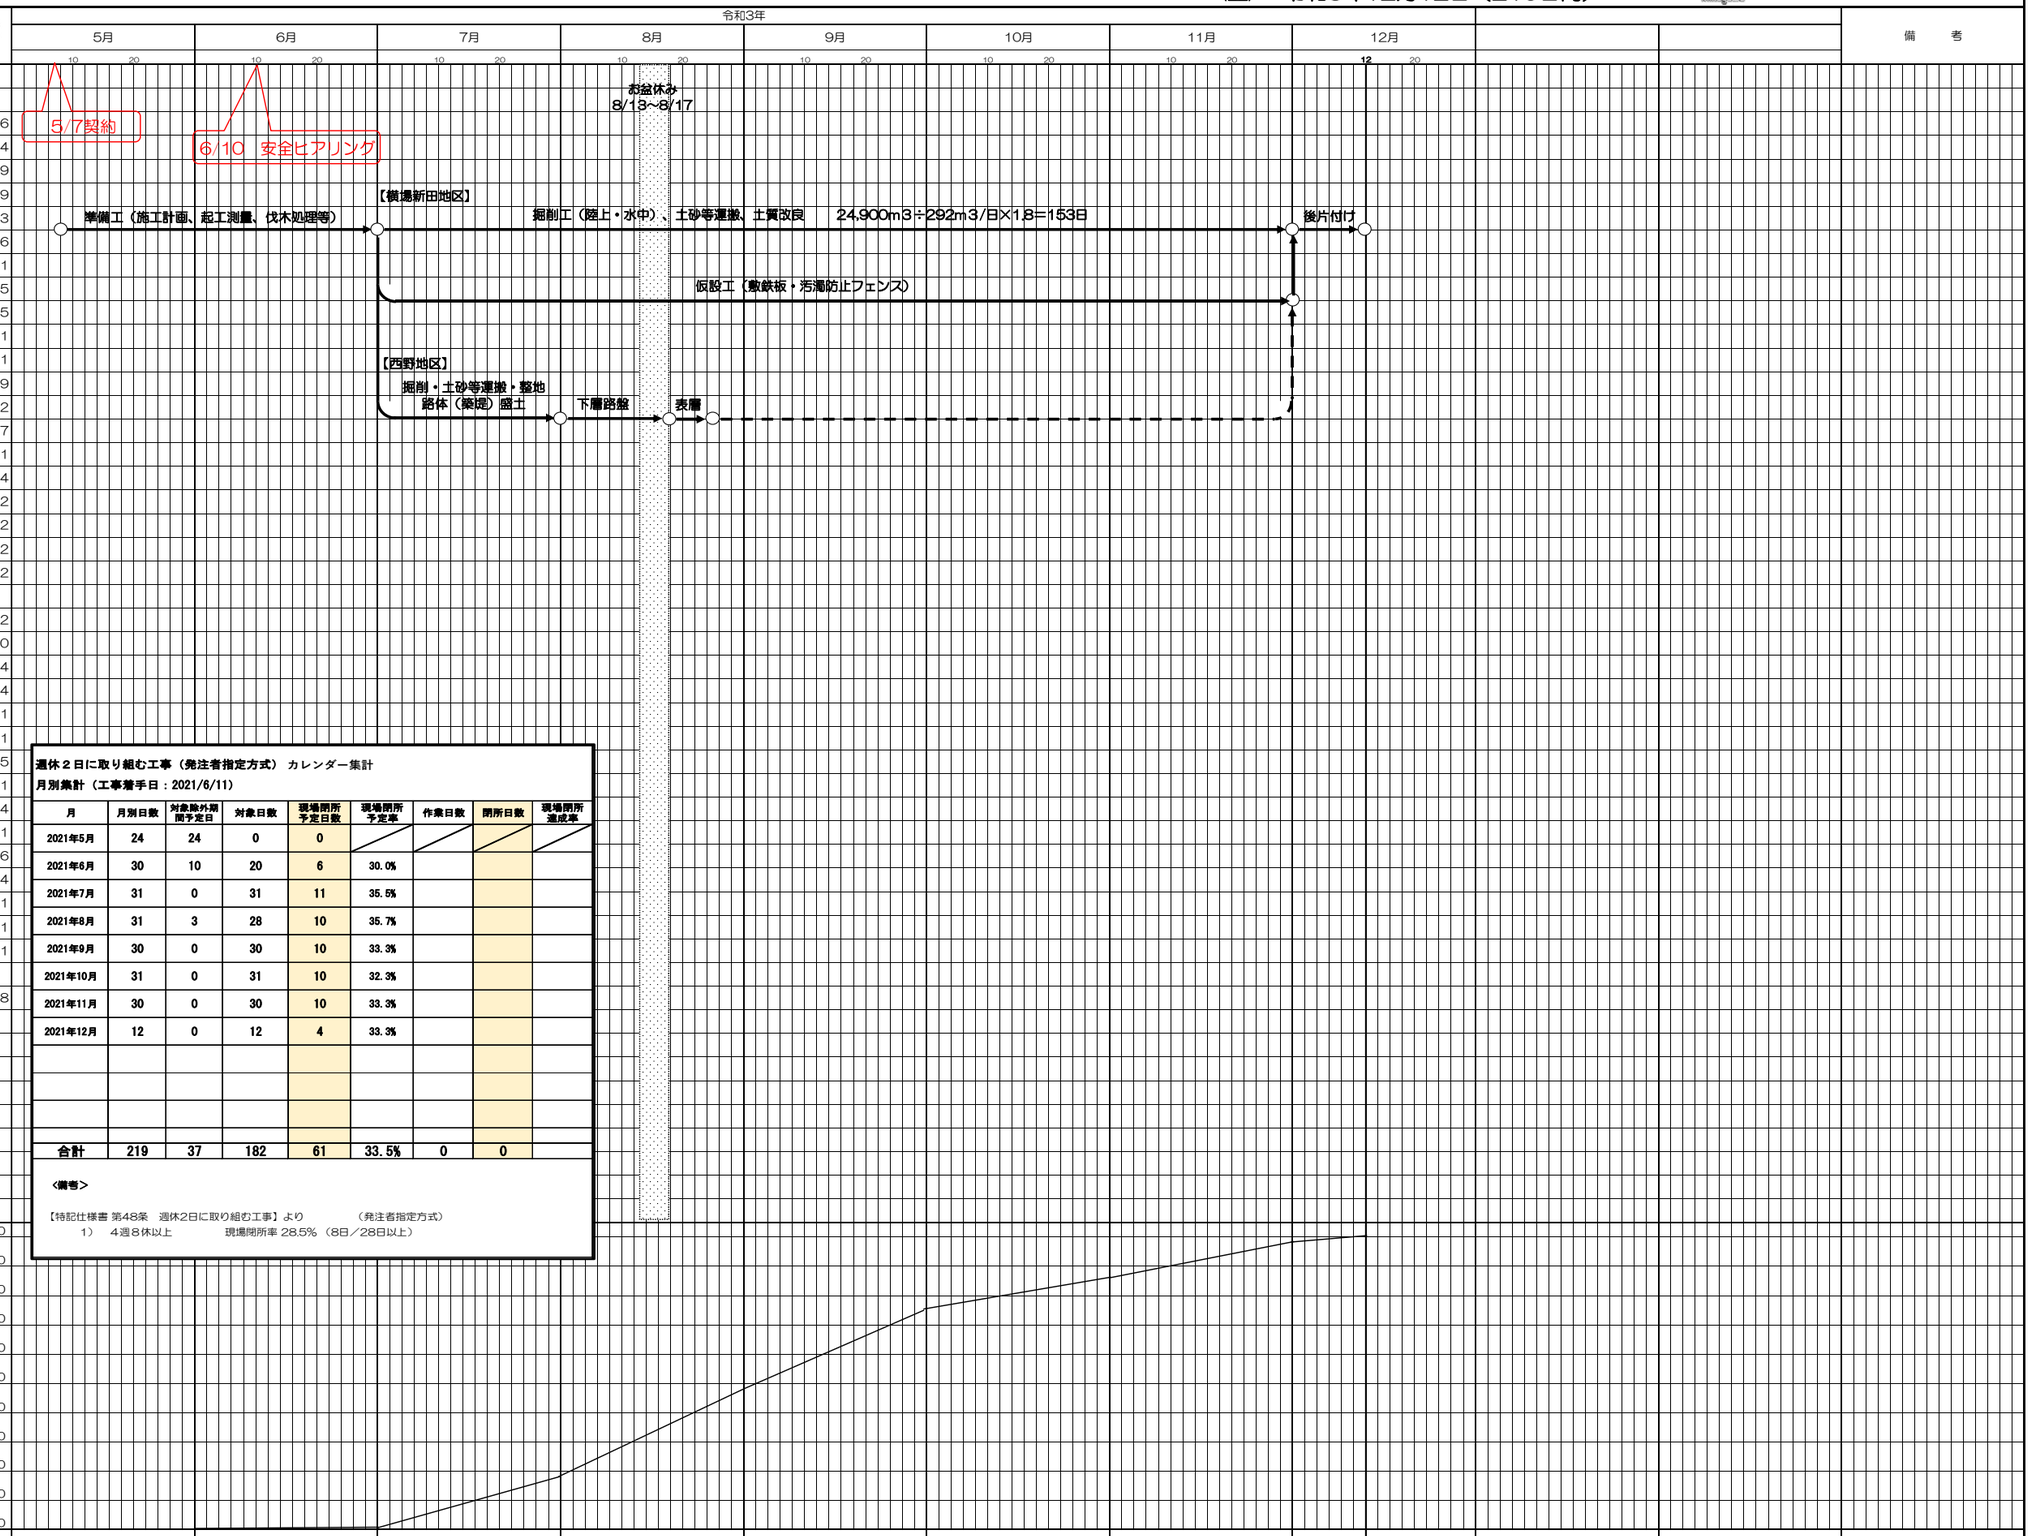

週休２日に取り組む工事（発注者指定方式） カレンダー集計
月別集計（工事着手日：2021/6/11）

月	月別日数	対象除外期間予定日	対象日数	現場閉所予定日数	現場閉所予定率	作業日数	閉所日数	現場閉所達成率
2021年5月	24	24	0	0				
2021年6月	30	10	20	6	30.0%			
2021年7月	31	0	31	11	35.5%			
2021年8月	31	3	28	10	35.7%			
2021年9月	30	0	30	10	33.3%			
2021年10月	31	0	31	10	32.3%			
2021年11月	30	0	30	10	33.3%			
2021年12月	12	0	12	4	33.3%			
合計	219	37	182	61	33.5%	0	0	

<備考>

【特記仕様書 第48条　週休2日に取り組む工事】より　　（発注者指定方式）
1）　４週８休以上　　現場閉所率 28.5%（8日／28日以上）

安 全 関 連 行 事												
出来高進捗率 (%)	計　画	0.0%	1.6%	18.6%	48.7%	75.4%	87.3%	98.9%	100%			
	実　施	0.0%										
